



RINGERIKE
n æ r m e s t d e t m e s t e

Ringerike legevakt

Presentasjon 5.mars 2024

Ringerike legevakt og ambulansesentral



OM PROSJEKTET:

- Etableres på søndre del av tomta til Ringerike sykehus med samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Vestre Viken Totalt areal ca. 2000 m2
- Mesterbygg Ringerike er total entreprenør
- Legevakt inneholder: venterom, resepsjon, legevaktsentral, akuttstue, lab, medisinrom, avklaringsrom, behandlingsrom, politiroom, kontorer og andre nødvendige funksjoner
- Ambulansesentral og tilhørende kontorer, samt vaskehall for ambulanserbiler og felles garderobe anlegg i kjeller etasjen
- Møtesenter med to møterom i 1. etg, kan brukes av Ringerike sykehus og legevakt kommuner





- Hovedfokus var å dimensjonere bygget i riktig størrelse og få til god logistikk og planløsning i bygget
- Bygget er dimensjonert og klargjort for en fremtidig etasje, samt mulig utvidelser av legevakt del og ekstra ambulanse. Møteromsdel kan tas i bruk ved kriser
- Mellomgang forbindelse til sykehuset for enklere transport av pasienter
- Prosjektet har stort fokus på synergi effekter ved drift. VVHF står for drift av bygget





- Fokus på optimalisering av løsninger, energi effektivitet og lave driftskostnader
- Klargjort for fremtidens IT løsninger innen helse (pasientjournal, kommunikasjon ansatte, betaling etc)
- Forutsatt tilnærmet «passivhus standard» og egen energiproduksjon (solceller). Minst 30% lavere energiforbruk enn tilsvarende referansebygg (teknisk byggeforskrift, TEK17), inntjeningstid 10- 15 år. Solceller produserer ca 50.000 kWh pr år





- - Bygget ble overlevert til brukere høsten 2020. LV flyttet inn februar 2021. Midt i en pandemi
- Økonomi:
- Godkjent kostnadsramme (P85) 107 MNOK.ink. mva.
- Total prosjektkostnad ved avslutning ca. 94 MNOK ink. mva.





Perspektiv fra sørøst

Ringerike legevakt

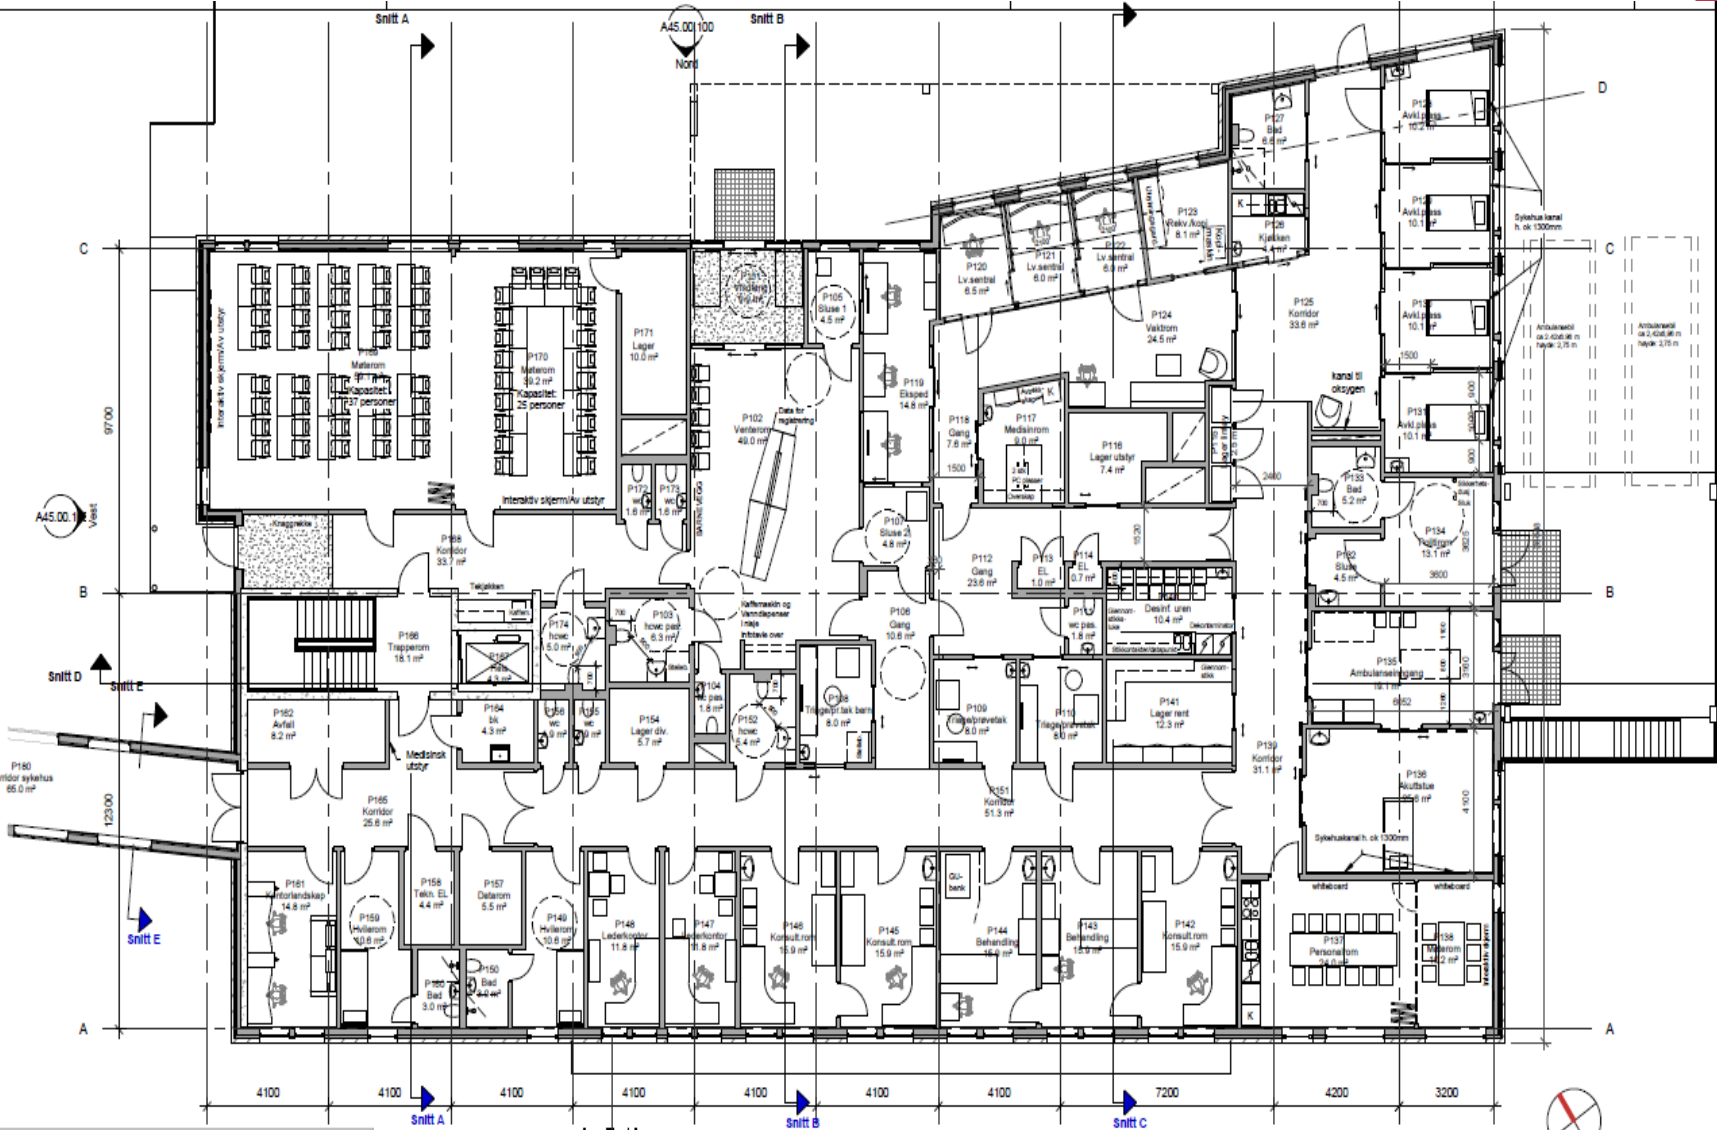

Legevakt



Legevakt



Legevakt





RINGERIKE

nærmest det meste
